

# **EKINTZA PLANEN BETETZE MAILAREN BALANTZEA**

**2008ko egoera eta 2009-2010  
urteetarako aurreikuspena**

**(2009-01-15)**

# AURKIBIDEA

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1- AURKEZPENA</b>                         | <b>2</b>  |
| <b>2- ARTISAUTZA</b>                         | <b>3</b>  |
| <b>3- IKUSIZKO ARTEAK</b>                    | <b>4</b>  |
| <b>4- IKUS-ENTZUNEZKOA</b>                   | <b>7</b>  |
| <b>5- DANTZA</b>                             | <b>10</b> |
| <b>6-ANTZERKIA</b>                           | <b>15</b> |
| <b>7- LITERATURA ETA LIBURUA</b>             | <b>20</b> |
| <b>8- LURRALDE GARAPENA</b>                  | <b>24</b> |
| <b>9- AGIRITEGIAK</b>                        | <b>25</b> |
| <b>10- LIBURUTEGIAK</b>                      | <b>26</b> |
| <b>11- ONDAREA</b>                           | <b>27</b> |
| <b>12- MUSEOAK</b>                           | <b>28</b> |
| <b>13- MUSIKA ETA FONOGRAFIA</b>             | <b>28</b> |
| <b>14- PLANEN BETETZE-MAILAREN LABURPENA</b> | <b>29</b> |

# 1- AURKEZPENA

Jarraian lan talde sektorialek osatu eta Erakundearteko Batzordeak onartutako ekintza plan desberdinen betetze-mailaren balantzea aurkezten da.

Ekintza-planen garapenaren ebaluazioa egiteko, proiektu bakoitza osatzen duten zereginak (atazak) aztertu dira, 2 eratako datuak lortuz :

- Ekintza- planean 2008rako planifikaturiko zeregin burutuak ehunekotan emanda.
- Ekintza-planaren barruan 2008ko zereginak duten pisua ehunekotan emanda (kontuan hartu behar da planetan aurreikusitako zeregin gehienak 2009an zehar garatu beharrekoak direla, batzuk oraindik aurrerago landuko direlarik).

Txosten hau atontzeko, sektoreetako talde operatiboek prestatutako planifikazioa erabili da, talde operatibo bakoitzak ekintza- plana zehazteko erabili duena hain zuzen.

Txostenean izartxoarekin markatutako proiektuak I. Planetik datozenak dira. Proiektu hauen jatorrizko formulazioa garatzeko zehaztasun maila altuagoa behar zenez, sektore batzuetako ekintza planetan sartu dira birformulatua.

## 2- ARTISAUTZA

| Proiektua   | Zeregina   | Burutua<br>Bai / ez | Aurreikusitako<br>egutegia | Aurreikusitako<br>zereginak -<br>egingabeak |
|---|--|---------------------|----------------------------|---|
| 1 PROIEKTUA<br>Informazio web<br>gune<br>amankomuna       | 1- Web-gunearen izena hartu  | Bai                 | 2008                       |   |
|   | 2- Haserako estrukturaren aurkezpena sektorearekin erkatzeko.                            | Bai                 | 2008                       |   |
|   | 3 -Web-gunera sarrera amankomun bat osatu.   | Bai                 | 2008                       |   |
|   | 4 -Artisauen erregistroko informazio eguneratu guztia web gunean sartu.                  |                     | 2009                       |   |
| 2. PROIEKTUA<br>Erregistro<br>irizpideen<br>harmonizazioa | 1 - Irizpideen harmonizazio aukerei buruzko ikerketa bat eskatu.                         | Bai                 | 2008                       |   |
|   | 2 - Bigarren harmonizazio aldia.   |                     | 2009                       |   |
| 3. PROIEKTUA<br>Azoketarako<br>politika                   | 1 - Azoketarako politika sustatzeko neurri posibleen oinarritzko dokumentu bat idaztea.. | Bai                 | 2008                       |   |
|   | 2 -Sektoreko ekarpenak biltzea   |                     | 2009                       |   |
|   | 3 - Erakundeetako araudiak eguneratzea.  |                     | 2009                       |   |
|   | 4 - Elkarrekin extraneteko foroan sartzeko mezu bat bidaltzea hilabetero.                | Bai                 | 2008                       |   |
|   | 5 - Artisautza zirkuitoak sortzea.   |                     | 2009                       |   |
| 4 PROIEKTUA<br>Negozio bide<br>berriak                    | 1- Merkataritza elektronikoaren inguruko ikastaroak antolatu                             | Bai                 | 2008                       |   |
|   | 2- Web orriak eratzeko laguntzak eman.   | Bai                 | 2008                       |   |
|   | 3- SPRIk emandako laguntza eta ikastaroen berri extranet bidez ematea                    | Ez                  | 2008                       |   |
| Egin beharreko<br>zereginak                               |  |                     |                            | 1   |

| PLANIFIKAZIOA    |                 |  | EBALUAZIOA                                       |  |
|------------------|-----------------|--|--|--|
| PROIEKTU KOPURUA | ZEREGIN KOPURUA | 2008rako AURREIKUSITAKO<br>ZEREGINAK (KOPURUA ETA<br>OSOAREKIKO PORTZENTAIA) | 2008rako PLANIFIKATUTAKO ZEREGIN<br>BURUTUAK (%) | PLANIFIKAZIO OROKORREAN<br>EGINDAKOA (%) |
| 4                | 14              | 9 (%65)  | % 88   | % 57                                     |

## 3- IKUSIZKO ARTEAK

| Proiektua   | Zeregina  | Burutua<br>Bai / ez | Aurreikusita<br>ko egutegia | Aurreikusitako<br>zereginak -<br>egingabeak |
|---|---|---------------------|-----------------------------|---|
| 14 PROIEKTUA<br>Hausnarketa esparrua  | "Heziketa artistikoa" ikerketaren enkargua  | Bai                 | 2008                        |   |
|   | "Heziketa artistikoa" ponentzia jasotzea  |                     | 2009                        |   |
|   | "Kultur politika ereduak" ikerketaren enkargua  | Bai                 | 2008                        |   |
|   | "Kultur politika ereduak" ponentzia   |                     | 2009                        |   |
|   | Hausnarketa esparrua sortu eta egokitzea  |                     | 2009                        |   |
| 1 Proiektua : Deialdien<br>malgutasuna handitzeko<br>ekintzak sustatzea.                                    | 3 neurri zehazten dira :<br>a) Balorazio batzordearekin elkarrizketa pertsonal bat eskatzeko aukera deialdian bertan sartzea, proiektua aurrez aurre aurkezteko aukera emanez.<br>b) Deialdietan bertan argi zehaztea, izen eta telefonoarekin, nor den bitartekaria, eskatzailearen galderak argitu ditzan.<br>c) Urtean deialdi bat baino gehiago egitea. | Bai                 | 2008                        |   |
| 2 PROIEKTUA:<br>Laguntzetan egindako<br>lan pertsonala<br>ekonomikoki balioan<br>jartzeko neurriak hartzea. | Lan aholkularitza enpresa bat kontratatzea orientazio lanetarako.   | Bai                 | 2008                        |   |
|   | Ikerketa osatu eta aurkeztea  |                     | 2009                        |   |
|   | Neurri berriak dagozkien oinarrietan sartzea.   |                     | 2009                        |   |
| 3 PROIEKTUA: Euskaditik<br>kanpoko<br>jendearentzako parte<br>hartze kuota zabaltzea.                       | Behin Erakundearteko Batzordeak neurriak onartzen dituenean,<br>dagozkien oinarrietan sartzea.  | Bai                 | 2008                        |   |
| 4 PROIEKTUA: Epaimahai<br>eta laguntza batzordeen<br>eraketa berria sustatzea.                              | Erakundearteko Batzordeak neurriak onartzen dituenean, hauek<br>dagozkien oinarrietan sartzea   | Bai                 | 2008                        |   |

| Proiektua   | Zeregina   | Burutua<br>Bai / ez | Aurreikusit<br>ako<br>egutegia | Aurreikusitako<br>zereginak -<br>egingabeak |
|---|--|---------------------|--------------------------------|---|
| 5 PROIEKTUA:<br>Formakuntza beka<br>igotzea.                                  | Erakundearteko taldearen bilera eskatutako beka definitu eta zehazteko.                                      | Bai                 | 2008                           |   |
| 6 PROIEKTUA: Mintegi eta kurtsoetarako finantziario lerro jarriak zabaltea.   | Erakundearteko taldearen bilera, finantziario lerro berriaren ezaugarriak zehazteko.                         | Bai                 | 2008                           |   |
| 7 PROIEKTUA: Sorkuntza beka iraupena luzatzea                                 | Erakundearteko taldearen bilera moldatuko diren laguntzak erabaki eta zehazteko.                             | Bai                 | 2008                           |   |
| 8 PROIEKTUA: EITBko kontratu programaren barruan euskal ekoizpenak sustatzea. | EJ eta EITBren arteko bilera, EITBko kontratu programaren ekintza lerroak definitzeko.                       | Bai                 | 2008                           |   |
| 9 PROIEKTUA:<br>Komisariatu eta kritika beka sustatzea.                       | Erakundearteko taldearen bilera laguntzak definitu eta zehazteko.  | Bai                 | 2008                           |   |
| 10 PROIEKTUA: Gure Artea sariak moldatzea.                                    | Gure Artea sariak moldatzeko ikerketa proiektuaren enkargua.   | Bai                 | 2008                           |   |
|   | Saria moldatzeko proposamenak aurkeztea.   | Ez                  | 2008                           | 1   |
|   | Proposamenak aztertuko dituen lan talde mistoa osatzea Eusko Jurlaritzak eta sektoreko profesionalen artean. |                     | 2009                           |   |
|   | Eusko Jurlaritzak aurkeztutako proposamenak onartu eta sariaren eredu berria idaztea.                        |                     | 2009                           |   |

| Proiektua  | Zeregina   | Burutua<br>Bai / ez | Aurreikusita<br>ko egutegia | Aurreikusitako<br>zereginak – egin<br>gabeak |
|--|--|---------------------|-----------------------------|--|
| 11 PROIEKTUA: Ekoizpena eta sorkuntzara bideratutako laguntzak sustatzea.                      | Erakundearteko taldearen bilera ekoizpen eta sorkuntzako laguntzak eta hauen igoera zehazteko.   | Bai                 | 2008                        |  |
| 12 PROIEKTUA: Ikusizko arteetako edukien jarraipena  | EITBko bigarren kontratu-programaren barruan sartzeko proposamena.   | Bai                 | 2008                        |  |
| 13 PROIEKTUA: Informazio web-gune amankomuna eratzea   | Lan talde mistoa ( erakundeak eta sektoreko profesionalak) eratzea web gunearen eduki eta parametro teknikoak erabakitzeko.  | Ez                  | 2008                        | 1  |
|  | Web gune bat sortzea   |                     | 2009                        |  |
|  | Edukiak igotzea.   |                     | 2009                        |  |
| 14 PROIEKTUA: Herralde ezberdinetako erakunde artistikoen arteko lankidetzaren sareak osatzea. | Erakunde, sektoreko profesionalak eta elkarkidetzaren sareetara lotutako unibertsitateen arteko talde bat sortzea proiektua definitu eta harremanak zein kontaktuak zehazteko. | Ez                  | 2008                        |  |
| Egin beharreko zereginak   |  |                     |                             | 2  |

| PLANIFIKAZIOA    |                 |  | EBALUAZIOA                                    |                                       |
|------------------|-----------------|--|---|---------------------------------------|
| PROIEKTU KOPURUA | ZEREGIN KOPURUA | 2008rako AURREIKUSITAKO ZEREGINAK (KOPURUA ETA OSOAREKIKO PORTZENTAIA) | 2008rako PLANIFIKATUTAKO ZEREGIN BURUTUAK (%) | PLANIFIKAZIO OROKORREAN EGINDAKOA (%) |
| 14               | 26              | 17 (%65)   | % 82  | % 53                                  |

## 4- IKUS-ENTZUNEZKOAK

| Proiektua   | Zeregina  | Burutua<br>Bai / ez | Aurreikusit<br>ako<br>egutegia | Aurreikusitako<br>zereginak -<br>egingabeak |
|---|---|---------------------|--------------------------------|---|
| 1 PROIEKTUA: Ikus-entzunezko ekoizpenerako laguntza sistema berria ezartzea                 | 1- Laguntza automatikoen proposamena definitzea ("15 + Bonus Sistema")  | Bai                 | 2008                           |   |
|   | 2- Talde mistoa eratzea   |                     | 2009                           |   |
|   | 3- Esparru ezberdinak lantzeko ikerketaren enkargua :<br>-TV movietako esperientzia, sorkuntza eta garapenerako laguntzak, euskara sustatzeko lerroak, euskari berriak garatzea...            | Bai                 | 2008                           |   |
|   | 4- Erakundearteko taldearen bilera, sortutako edukien zein mapen gaineko hausnarketa egiteko.   |                     | 2009                           |   |
| 2 PROIEKTUA: Laguntzen egoeraren mapa bat eratzea   | 1- Laguntzen Mapa eratzea   | Bai                 | 2008                           |   |
|   | 2- Formakuntza alorraren egoeraren mapa eratzea.  |                     | 2009                           |   |
| 3 PROIEKTUA: Zinemaren Legearen jarraipena egitea, batez ere hizkuntza koofizialen atalean. | 1-Gaia lantzeko hitzarmenak Kultura Ministeriorarekin.  | Bai                 | 2008                           |   |
| 4 PROIEKTUA: Europako zinema eskoletan ikasi Ahal izateko trebakuntza bekak sustatzea.      | 1- Eskura dauden mapetan oinarrituz (1 eta 2 proiektuak) Erakundearteko Batzordearen bilera bat burutuko da gaia lantzeko.  |                     | 2009                           |   |
| 5 PROIEKTUA: Hezkuntza Sailarekin garatu beharreko zereginak.                               | Hezkuntza Sailarekin elkarlanean, planean definitutako 4 proposamenak lantzea.<br>Ikus-entzunezkoa ikastetxeetako jarduera osagarri bat izateko aukera aztertzea Hezkuntza Sailarekin batera. | Ez                  | 2008                           | 1   |



| Proiektua  | Zeregina  | Burutua<br>Bai / ez | Aurreikusitako<br>egutegia | Aurreikusitako<br>zereginak -<br>egingabeak |
|--|---|---------------------|----------------------------|---|
| 5 PROIEKTUA: Hezkuntza Sailarekin garatu beharreko zereginak.                          | 2-Organismo (edo lan talde) bat sortzea Goi Mailako heziketaren mapa eta egoera aztertzeke. Era berean beharizan formatiboak, kudeaketa, tekniko zein sorkuntza alorrekoak beteko dituen proposamena egin beharko du lan taldeak. | Bai                 | 2008                       |   |
|  | 3-Aurrekoarekin loturik, sektoreko kidei teknologia berrietako tresna desberdinen ezagutza eta trebakuntza bermatzeko formulak garatzea eskatzen da.  | Bai                 | 2008                       |   |
|  | 4- Ikastetxeetatik pirateriaren aurkako sentsibilizazio kanpainak martxan jartzea.  | Ez                  | 2008                       |   |
| * 6 PROIEKTUA: Euskarazko zinemaren erakusketa eta banaketa sustatzea.                 | 1- DVD filmen bikoizketa eta bikoiztutako filmen proiektzioa.   | Bai                 | 2008                       |   |
| 7 PROIEKTUA: Euskal ekoizpenak zabaltea EITBko kontratu-programaren baitan             | 2- EJ eta ETBren arteko bilera jarduera lerroak definitzeko.  | Bai                 | 2008                       |   |
| 8 PROIEKTUA: Internazionalizazioan lagunduko duten eduki eta formulak bilatzea.        | 1- Markaren definizioa. Haserako puntua: BASQUE AUDIOVISUAL   | Ez                  | 2008                       | 1   |
|  | 2- Jaialdi eta merkatu desberdinetan euskal presentzia bermatzeko hirurteko plana definitzea.   |                     | 2009                       |   |
|  | 3- Internazionalizazio ereduaren ikerketa   |                     | 2009                       |   |
| 9 PROIEKTUA: Euskal Zinema eta euskarazko filmek interneten duten presentzia ikertzea. | 1- Honen inguruko aukerak aztertzea (digitalizazioa, presentzia...)   |                     | 2009                       |   |

\* I. Kulturaren Euskal Planetik jasotako proiektua.

| Proiektua   | Zeregina  | Burutua<br>Bai / ez | Aurreikusita<br>ko egutegia | Aurreikusita<br>ko<br>zereginak -<br>egingabeak |
|---|---|---------------------|-----------------------------|---|
| 10 PROIEKTUA: Hiriguneetako zinemak mantentzeko formulen ikerketa konparatiboa. | 1-Haserako txostena osatzea, hor edukiak, ereduak eta ikerketa osatzeko erreferenteak zehaztuko dira.   | Bai                 | 2008                        |   |
|   | 2- Proiektu ikerketaren aurkezpena  |                     | 2009                        |   |
|   | 3- Kontraste bilera   |                     | 2009                        |   |
| 11 PROIEKTUA: Teknologia berriekin lotutako negozio eredu berrien ikerketa.     | 1-Teknologia berrien aurrean sektorearen egoera ikertzeko enkargua egitea. Egoera mapa eta negozio eredu berriak identifikatzeko esperientzia pilotuak. | Bai                 | 2008                        |   |
|   | 2- Proiektuaren ikerketa txostena aurkeztea.  |                     | 2009                        |   |
|   | 3- Kontraste bilera   |                     | 2009                        |   |
| Egin beharreko zereginak  |   |                     |                             | 3   |

| PLANIFIKAZIOA    |                 |  | EBALUAZIOA                                    |                                       |
|------------------|-----------------|--|---|---------------------------------------|
| PROIEKTU KOPURUA | ZEREGIN KOPURUA | 2008rako AURREIKUSITAKO ZEREGINAK (KOPURUA ETA OSOAREKIKO PORTZENTAIA) | 2008rako PLANIFIKATUTAKO ZEREGIN BURUTUAK (%) | PLANIFIKAZIO OROKORREAN EGINDAKOA (%) |
| 11               | 35              | 21 (% 60)  | % 85  | % 51                                  |

## 5- DANTZA

| Proiektua   | Zeregina  | Burutua<br>Bai / ez | Aurreikusitako<br>egutegia | Aurreikusitako<br>zereginak -<br>egingabeak |
|---|---|---------------------|----------------------------|---|
| 1 PROIEKTUA:<br>Dantza<br>Guneak edo<br>Baliabide<br>Zentroak<br>sortzea,<br>Dantzarako<br>oinarrizko<br>erreferente<br>gisa. | 1- Lurralde bakoitzaren aukerak aztertzeko Erakundeen eta Eusko Jaurlaritzaren artean beharrezkoak diren harremanak garatzea.                                     | Bai                 | 2008                       |   |
|   | 2- Proiektua martxan jartzeko erakundearteko hitzarmena.  |                     | 2009                       |   |
|   | 3- Koordinazio orokorra eramango duen enpresa kontratatzea.   |                     | 2009                       |   |
|   | 4- Talde Operatiboaren bilerarako deialdia  |                     | 2009                       |   |
|   | 5- Talde operatiboaren bilera   |                     | 2009                       |   |
| 2 PROIEKTUA:<br>Dantza eta<br>eskema<br>tradizionaleko<br>dokumentazio<br>a kudeatzeko<br>sistema<br>estrukturatzea           | 1- Proiektuaren planifikazioa egitea.   | Bai                 | 2008                       |   |
|   | 2- Lehen lan bilerarako deialdia  | Bai                 | 2008                       |   |
|   | 3- Eresbil eta Eusko Ikaskuntzaren arteko lehen bilera.   | Bai                 | 2008                       |   |
|   | 4- Bigarren lan bilerarako deialdia   | Bai                 | 2008                       |   |
|   | 5- Eresbil eta Eusko Ikaskuntzaren arteko bigarren bilera.  | Bai                 | 2008                       |   |
|   | 6- Proiektuen diseinua eta hauek eskatzea: Dokumentazio eta Agiritegien Mapa eta Artxibo Sistemaren proposamena 2. Behin behineko artxibo sistema baten enkargua. | Bai                 | 2008                       |   |
|   | 7- Dagozkien enpresek aurrekontuak aurkeztea.   | Bai                 | 2008                       |   |
|   | 8- Landa-lana: Kontrataturako pertsonak beraien zereginak egitea.   |                     | 2009                       |   |

| Proiektua  | Zeregina   | Burutua<br>Bai / ez | Aurreikusitako<br>egutegia | Aurreikusitako<br>zereginak -<br>egingabeak |
|--|--|---------------------|----------------------------|---|
| 3 PROIEKTUA:<br>Oinarrizko eta<br>erdi mailako<br>zentro<br>arautuen sarea<br>osatu eta<br>dantzako goi<br>mailako zikloa<br>martxan<br>jartzea. | 1-Proiektuaren planifikazioa eta kronograma idaztea.   | Bai                 | 2008                       |   |
|  | 2- Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarekin bilera, Plan honi buruz hitz egin eta lanerako gonbita egiteko.  |                     | 2009                       |   |
|  | 3- Dantzako oinarrizko hezkuntzarentzako lan talde bat proposatzea, parte hartzaileak eta gaitegia zehaztuz. |                     | 2009                       |   |
|  | 4- Aurreikusitako bi bileretako deialdia.  |                     | 2009                       |   |
|  | 5-Lan taldearen lehen bilera   |                     | 2009                       |   |
|  | 6- Lan taldearen bigarren bilera   |                     | 2009                       |   |
|  | 7- Dantzako heziketa profesionalerako lan talde bat proposatzea, parte hartzaileak eta gaitegia zehaztuz.    |                     | 2009                       |   |
|  | 8- Aurreikusitako bi bileretako deialdia   |                     | 2009                       |   |
|  | 9- Lan taldearen lehen bilera  |                     | 2009                       |   |
|  | 10- Lan taldearen bigarren bilera  |                     | 2009                       |   |
|  | 11- Dantzako goi mailako heziketarako lan taldea proposatzea, parte hartzaileak eta gaitegia zehaztuz.       |                     | 2009                       |   |
|  | 12- Aurreikusitako bi bileretarako deialdia  |                     | 2009                       |   |
|  | 13- Lan taldearen lehen bilera   |                     | 2009                       |   |
|  | 14- Lan taldearen bigarren bilera  |                     | 2009                       |   |
|  | 15- Hezkuntza Sailarekin bilera, proposameneren berri emateko.   |                     | 2010                       |   |
|  | 16- Ekintzen jarraipena eta balorazioa   |                     | 2010                       |   |

| Proiektua   | Zeregina  | Burutua<br>Bai / ez | Aurreikusitako<br>egutegia | Aurreikusitako<br>zereginak -<br>egingabeak |
|---|---|---------------------|----------------------------|---|
| 4 PROIEKTUA:<br>Dantzako<br>laguntza –<br>deialdien,<br>analisi,<br>berrikusketa<br>eta<br>moldaketa.     | 1-Dantza sektorerako bideratutako laguntzen mapa osatzea.   | Bai                 | 2008                       |   |
|   | 2- Laguntzen mapa bukatzea.   |                     | 2009                       |   |
|   | 3- Erakundearteko taldearen bilerarako deialdia eta ekarpenetatik ateratako dokumentazioa bidaltzea.                                |                     | 2009                       |   |
|   | 4-Erakundearteko taldearen bilera, proposamena osatu eta adosteko.  |                     | 2009                       |   |
|   | 5- Moldaketa-proposamena dokumentuan idaztea.   |                     | 2009                       |   |
|   | 6- Sortutako dokumentua eta deialdia talde operatiboari bidaltzea.  |                     | 2009                       |   |
|   | 7-Talde operatiboaren bilera.   |                     | 2009                       |   |
|   | 8- Proposamen definitiboa Erakundearteko Batzordera bidaltzea.  |                     | 2009                       |   |
| 5 PROIEKTUA:<br>Sorkuntza eta<br>ekoizpen<br>proiektuak<br>sendotzeko<br>laguntza<br>bideak<br>zabaltzea. | 1- Esperientziak biltzen hastea   | Bai                 | 2008                       |   |
|   | 2- Aztertutako esperientziekin dokumentu bat osatzea  |                     | 2009                       |   |
|   | 3- Erakundearteko taldearen bilerarako deialdia eta materialak bidaltzea  |                     | 2009                       |   |
|   | 4- Proposamen konkretuak definitzeko erakundearteko taldearen lehen bilera.   |                     | 2009                       |   |
|   | 5- Definitutako proposamenarekin dokumentu bat idaztea.   |                     | 2009                       |   |
|   | 6- Talde Operatiboaren deialdia, proposamena erakundearteko taldera bidaltzeko.   |                     | 2009                       |   |
|   | 7- Talde Operatiboaren bilera, Erakundearteko taldeak sorkuntza eta ekoizpen proiektuak sendotzeko egindako proposamenak onesteko . |                     | 2009                       |   |
|   | 8-Proposamen definitiboa Erakundearteko Batzordera bidaltzea.   |                     | 2009                       |   |

| Proiektua  | Zeregina   | Burutua<br>Bai / ez | Aurreikusitako<br>egutegia | Aurreikusitako<br>zereginak -<br>egingabeak |
|--|--|---------------------|----------------------------|---|
| 6 PROIEKTUA:<br>Sektorearen<br>estruturazioa<br>indartzea<br>elkarte eta<br>jarduera<br>sendoenei<br>lagunduz. | 1-Elkarte sektorialak identifikatzen hastea : pertsona eta elkarteak, bakoitzak lantzen duen jarduera edo esparrua.                | Bai                 | 2008                       |   |
|  | 2- Elkarte sektorialak zehazten dituen dokumentua bukatzea : pertsona eta elkarteak, bakoitzak lantzen duen jarduera edo esparrua. |                     | 2009                       |   |
|  | 3- Erakundearteko taldearen bilerako deialdia eta dokumentua bidaltzea.  |                     | 2009                       |   |
|  | 4- Sektorearen estruturazioa indartzeko erakundearteko taldearen bilera.   |                     | 2009                       |   |
|  | 5- Erakundearteko taldearen proposamenarekin dokumentu bat osatzea.  |                     | 2009                       |   |
|  | 6- Erakundearteko taldearen proposamena talde operatiboari helarazteko bileraren deialdia.   |                     | 2009                       |   |
|  | 7- Talde Operatiboaren bilera erakundearteko taldeak sektorea indartzeko egindako proposamena onartzeko.                           |                     | 2009                       |   |
|  | 8- Proposamen definitiboa Erakundearteko Batzordera bidaltzea.   |                     | 2009                       |   |

| Proiektua   | Zeregina   | Burutua<br>Bai / ez  | Aurreikusitako<br>egutegia                    | Aurreikusitako<br>zereginak -<br>egingabeak |
|---|--|--|---|---|
| 7 PROIEKTUA:<br>Etengabeko<br>Trebakuntzaren<br>koordinazio<br>Mahaia | 1- Proiektua garatzeko planifikazioa eta kronogramara idaztea.                               | Bai  | 2008  |   |
|   | 2- Lan taldearentzako gaitetgia eta egutegia prestatzea.                                     |  | 2009  |   |
|   | 3- Lan talde proposamena, pertsonekin harremanetan jartzea eta gaitetgia zehaztea.           |  | 2009  |   |
|   | 4- Lan taldeari deialdia bidaltzea.  |  | 2009  |   |
|   | 5- Lehen lan bilera prestatu eta koordinatzea.   |  | 2009  |   |
|   | 6- Lehen bilerako txostena prestatzea.   |  | 2009  |   |
|   | 7- Txostena lankideei bidali eta hauen iritziak jasotzea.                                    |  | 2009  |   |
|   | 8- Lan taldearen bigarren bilerarako deialdia bidaltzea.                                     |  | 2009  |   |
|   | 9- Bigarren lan bilera prestatu eta koordinatzea.  |  | 2009  |   |
|   | 10- Txosten definitiboa prestatzea.  |  | 2009  |   |
|   | 11- Txostena lankideei bidali eta iritziak jasotzea  |  | 2009  |   |
|   | 12- Jasotako iritziak txostenean sartu eta hau ixtea   |  | 2009  |   |
|   | 13- EJ eta KL arteko balantze bilera.  |  | 2009  |   |
| 8 PROIEKTUA:<br>Dantzako<br>programazioa<br>indartzea                 | 1- Gaur eguneko dantza zirkuitua zabaltzeko proposamena SAREako urtarrileko bileran sartzea. |  | 2009  |   |
|   | 2- Bileran erabakitakoan oinarrituz proiektuaren planifikazioa egitea.                       |  | 2009  |   |
| Egin beharreko zereginak  |  |  |   | 0   |
| PLANIFIKAZIOA   |  |  | EBALUAZIOA                                    |   |
| PROIEKTU KOPURUA  | ZEREGIN KOPURUA  | 2008rako AURREIKUSITAKO ZEREGINAK (KOPURUA ETA OSOAREKIKO PORTZENTAIA) | 2008rako PLANIFIKATUTAKO ZEREGIN BURUTUAK (%) | PLANIFIKAZIO OROKORREAN EGINDAKOA (%)       |
| 8   | 58   | 13 (% 29)  | % 100   | % 29  |

## 6- ANTZERKIA

| Proiektua                                       | Zeregina   | Burutua<br>Bai / ez | Aurreikusitako<br>egutegia | Aurreikusitak<br>o zereginak<br>-<br>egingabeak |
|---|--|---------------------|----------------------------|---|
| 1 PROIEKTUA:<br>SAREaren<br>izaera<br>juridikoa | 1-SAREaren ezaugarri estrukturalak eta funtzionalak biltzen dituen oinarri-zirriborro bat idaztea.         | Bai                 | 2008                       |   |
|   | 2 – Zirriborroan bildutako ezaugarriak garatzeko dokumentu baten enkargua.                                 | Bai                 | 2008                       |   |
|   | 3- Dokumentua bukatu eta aurkeztea   |                     | 2009                       |   |
|   | 4- Anlisi eta definizio bilerarako deialdia  |                     | 2009                       |   |
|   | 5- Anlisi eta definizio bilera   |                     | 2009                       |   |
|   | 6- Bukaera, ikerketaren aurkezpena eta erakundearteko taldeko kideen artean banatzea, hauek azter dezaten. |                     | 2009                       |   |
|   | 7- Definizio bilerarako deialdia   |                     | 2009                       |   |
|   | 8- Definizio bilera  |                     | 2009                       |   |
| 2 PROIEKTUA:<br>Kale antzerkia<br>sartzea       | 1-Lehen analisi baterako deialdia.   |                     | 2009                       |   |
|   | 2-Lehen analisi baterako lan taldearen bilera.   |                     | 2009                       |   |
|   | 3- Herri eta erkidego desberdinetako ereduak bildu eta extranetean zintzilikatzea.                         |                     | 2009                       |   |
|   | 4-Aztertutako ereduaren inguruan erabakiak hartzeko lan taldearen bilerarako deialdia.                     |                     | 2009                       |   |
|   | 5-Aztertutako ereduaren gainean erabakiak hartzeko bilera.   |                     | 2009                       |   |



| Proiektua   | Zeregina  | Burutua<br>Bai / ez | Aurreikusitako<br>egutegia | Aurreikusitako<br>zereginak –egin<br>gabeak |
|---|---|---------------------|----------------------------|---|
| 3 PROIEKTUA:<br>Erresidentzi<br>programak<br>ezartzea   | 1- Herri eta erkidego desberdinetako ereduak jasotzea.  | Bai                 | 2008                       |   |
|   | 2- Eredu-bilketa bukatzea.  |                     | 2009                       |   |
|   | 3- Lehen lan bilerarako deialdia eta bildutako dokumentuak bidaltzea.   |                     | 2009                       |   |
|   | 4- Lan taldearen bilera lehen analisi bat egiteko.  |                     | 2009                       |   |
| 4 PROIEKTUA:<br>SAREaren<br>hausnarketa<br>estrategikoa | 1-SAREAKo hausnarketa estrategikoan aztertu beharreko ezaugarri garrantzitsuenen zirriborroa idaztea.                               | Bai                 | 2008                       |   |
|   | 2- Hausnarketa estrategikoaren ezaugarri garrantzitsuenak biltzeko dokumentua egingo duen enpresa kontratatzea.                     | Bai                 | 2008                       |   |
|   | 3-Eskatutako dokumentua bukatu eta aurkeztea.   |                     | 2009                       |   |
|   | 4- Lan jardunaldi batetarako deialdia non hausnarketarako bidea zabalduko duen dokumentua aurkeztuko da.                            |                     | 2009                       |   |
|   | 5-Lan jardunaldia Talde Operatiboarekin, Jose Luisek osatutako SAREAKo hausnarketa estrategikoaren dokumentua aurkeztuko da bertan. |                     | 2009                       |   |
|   | 6- Extranetean sektoreak bere ekarpenak aurkezteko atal bat zabaltzea.  |                     | 2009                       |   |
|   | 7- Ekarpenak aurkezteko epea itxi eta jasotakoekin dokumentua berridaztea.  |                     | 2009                       |   |
|   | 8- Dokumentua gizarteratzea   |                     | 2009                       |   |

| Proiektua  | Zeregina   | Burutua<br>Bai / ez | Aurreikusitako<br>egutegia | Aurreikusitako<br>zereginak -<br>egingabeak |
|--|--|---------------------|----------------------------|---|
| 5 PROIEKTUA:<br>Antzerki<br>jardueretarak<br>o laguntzen<br>markoa | 1- Bilera deialdia eta materialak bidaltzea. Bi dokumentu dira : Eskenak prestatutako laguntza ereduaren proposamena eta KEPeko antzerkiko laguntzen mapa. | Bai                 | 2008                       |   |
|  | 2-Lan taldearen bilera ekarpenak aztertu eta proposamen berriak eta moldaketa lerroak aztertzeko.  | Bai                 | 2008                       |   |
|  | 3- Aldundien informazioarekin Eskenako dokumentua osatzea.   |                     | 2009                       |   |
|  | 4- Ekarpen-aldia extranetean.  |                     | 2009                       |   |
|  | 5- Ekarpen-aldiaren bukaera.   |                     | 2009                       |   |
|  | 6- Proposamen berriak eta moldaketak Erakundearteko Batzordera bidaltzea.  |                     | 2009                       |   |
| 6 PROIEKTUA:<br>Ekoizpen<br>publiko<br>markoak.                    | 1- Ekoizpen unitate publikoen eredu(k) definitzen dituen oinarri-dokumentua idaztea.   |                     | 2009                       |   |
|  | 2- Dokumentua lan taldeari bidaltzea. ( Erakundearteko taldea + Eskena + Sarea + Fernano Bernués)  |                     | 2009                       |   |
|  | 3- Bilera deialdia bidaltzea   |                     | 2009                       |   |
|  | 4- Talde mistoaren bilera proposamenak aztertu eta proposatu beharreko eredu adosteko.   |                     | 2009                       |   |

| Proiektua   | Zeregina   | Burutua<br>Bai / ez | Aurreikusitako<br>egutegia | Aurreikusitako<br>zereginak -<br>egingabeak |
|---|--|---------------------|----------------------------|---|
| 7 PROIEKTUA:<br>Euskal<br>Antzerkiaren<br>kanpo<br>promoziorako<br>plana        | 1- Promozio Planaren hastapen – dokumentua idazten hastea.                                 | Bai                 | 2008                       |   |
|   | 2- Eskenak hasitako Promozio Plana osatzea.  | Ez                  | 2008                       | 1   |
|   | 3-Dokumentua lan taldeko agenteei bidaltzea hauek aztertu dezaten.                         |                     | 2009                       |   |
|   | 4- Lan taldearen bilerarako deialdia.  |                     | 2009                       |   |
|   | 5- Lan taldearen bilera Promozio Plana adostu eta onartzeko.                               |                     | 2009                       |   |
|   | 6- Promozio Planaren planifikazio zehatza.   |                     | 2009                       |   |
|   | 7- Planifikazioa Etxepare Institutura bidaltzea hauen laguntza aztertzeko.                 |                     |                            |   |
| 8 PROIEKTUA:<br>Euskal<br>Antzerkiaren<br>sustapena<br>Madril –<br>Bartzelonan. | 1- Madrilen esku hartze eredu bat(zu)en proposamena idaztea.                               |                     | 2009                       |   |
|   | 2- Bilerarako deialdia eta materialak bidaltzea.   |                     | 2009                       |   |
|   | 3-Lan taldearen analisi-bilera.  |                     | 2009                       |   |
|   | 4- Analisi-bileran aukeratutako proposamenak zehaztu eta bideragarritasun ikerketa egitea. |                     | 2009                       |   |
|   | 5- Onespen bileraren deialdia lan taldeari bidaltzea.                                      |                     | 2009                       |   |
|   | 6- Proiektuari onespena emateko bilera   |                     | 2009                       |   |

| Proiektua   | Zeregina   | Burutua<br>Bai / ez | Aurreikusitako<br>egutegia | Aurreikusitako<br>zereginak -<br>egingabeak |
|---|--|---------------------|----------------------------|---|
| 9 PROIEKTUA:<br>Zerbitzuen<br>Pool-a.   | 1- Proiektuaren helburuak, ezaugarriak eta elementu garrantzitsuenak biltzen dituen dokumentua sortzea.        |                     | 2009                       |   |
|   | 2-Lan bileraren deialdia eta dokumentuak bidaltzea.  |                     | 2009                       |   |
|   | 3- Planteamendu orokorra aztertu eta onartzeko lan taldearen bilera.   |                     | 2009                       |   |
|   | 4-Bideragarritasun Plana idaztea.  |                     | 2009                       |   |
| 10 PROIEKTUA:<br>Publikoen<br>kudeaketa<br>sistema.                                       | 1- Lan taldearen bilerako deialdia.  | Bai                 | 2008                       |   |
|   | 2- Lan taldearen bilera  | Bai                 | 2008                       |   |
|   | 3- Bigarren bilera baterako deialdia bidaltzea.  | Bai                 | 2008                       |   |
|   | 4- Bigarren bilera   | Bai                 | 2008                       |   |
|   | 5- Promozio Planaren enpresa /pertsona bati egiteko eskatzea .   | Bai                 | 2008                       |   |
|   | 6- Promozio Plana bukatzea.  |                     | 2009                       |   |
|   | 7-Promozio Plana onartzeko bilera deialdia.  |                     | 2009                       |   |
|   | 8- Promozio plana aurkeztu eta onartzeko bilera.   |                     | 2009                       |   |
| 11 PROIEKTUA:<br>Antzerki eta<br>gazte zein<br>haurren arteko<br>harremanak<br>sustatzea. | 1- Estatu mailako zein nazioarteko ereduaren zerrenda osatzea.   |                     | 2009                       |   |
|   | 2-Lan taldearen bilerarako deialdia eta dokumentuak bidaltzea.   |                     | 2009                       |   |
|   | 3- Esperientziak aztertze lan taldearen bilera, EAEko zentroetan ezarri daitezkeen proposamen zehatzak sortuz. |                     | 2009                       |   |
|   | 4- Gazteen eta antzerkiaren arteko erlazioa errazteko proposamen konkretuen dokumentua osatzea.                |                     | 2009                       |   |
| Egin beharreko zereginak  |  |                     |                            | 1   |

| PLANIFIKAZIOA    |                 |  | EBALUAZIOA                                    |                                       |
|------------------|-----------------|--|---|---------------------------------------|
| PROIEKTU KOPURUA | ZEREGIN KOPURUA | 2008rako AURREIKUSITAKO ZEREGINAK (KOPURUA ETA OSOAREKIKO PORTZENTAIA) | 2008rako PLANIFIKATUTAKO ZEREGIN BURUTUAK (%) | PLANIFIKAZIO OROKORREAN EGINDAKOA (%) |
| 11               | 64              | 15 (23%)   | 93 %  | 22 %                                  |

## 7- LITERATURA ETA LIBURUA

| Proiektua  | Zeregina   | Burutua<br>Bai / ez | Aurreikusitako<br>egutegia | Aurreikusitako<br>zereginak -<br>egingabeak |
|--|--|---------------------|----------------------------|---|
| 1 PROIEKTUA:<br>Sektorera<br>bideratutako<br>laguntza eta<br>hitzarmenen<br>mapa berrikusi.    | 1- Sektorera bideratutako laguntza- lerroen dokumentua idaztea.  | Bai                 | 2008                       |   |
|  | 2- Extranetean ekarpenak egiteko atala zabaltzea.  |                     | 2009                       |   |
|  | 3- Deialdia eta bilera materiala bidaltzea.  |                     | 2009                       |   |
|  | 4- Laguntza lerroen analisirako lan taldearen bilera.  |                     | 2009                       |   |
|  | 5- Proposatutako lerroak Erakundearteko Batzordera bidaltzea.  |                     | 2009                       |   |
| 2 PROIEKTUA.<br>Euskadi<br>Literatura Sarien<br>barruan<br>ilustratzailearen<br>saria zehaztu. | 1- Antzerako sariei buruzko informazioa bildu eta aztertzea (estatu mailan zein nazioartean). Literatura Sarietarako sari proposamena idaztea. | Bai                 | 2008                       |   |
|  | 2- Bilera deialdia   | Bai                 | 2008                       |   |
|  | 3- Proposamenak definitzeko bilera   | Bai                 | 2008                       |   |
|  | 4- Agindua idaztea   |                     | 2009                       |   |
|  | 5- Aldizkarian argitaratzea  |                     | 2009                       |   |
| 3 PROIEKTUA:<br>Irakurzaletasuna<br>sustatzeko<br>estrategia                                   | 1- Kultur Ondarearen Zuzendaritzari informazio eskatu eta idazleen elkartera bidali.   |                     | 2009                       |   |
|  | 2- Ondarea, Hezkuntza eta Idazleen Elkartearen arteko bilera deialdia bidaltzea.   |                     | 2009                       |   |
|  | 3- Ondarea, Hezkuntza eta Idazleen Elkartearen arteko bilera   |                     | 2009                       |   |
|  | 4- Landa-lana: Esperientziak biltzea, interes taldeak identifikatu eta proposamena idaztea.  |                     | 2009                       |   |
|  | 5- Proposamena onartu eta zabaltzeko aditu taldea lanean jartzea.  |                     | 2009                       |   |
|  | 6- Proposamena txosten definitibo batean idatzi eta Talde Operatiboari aurkeztea.  |                     | 2009                       |   |

| Proiektua  | Zeregina  | Burutua<br>Bai / ez | Aurreikusitako<br>egutegia | Aurreikusitako<br>zereginak -<br>egingabeak |
|--|---|---------------------|----------------------------|---|
| 4 PROIEKTUA:<br>Euskal<br>literatura eta<br>liburuaren<br>Promozio<br>Plana. | 1- Promozio Planaren ideia eta helburuak markatuko dituen oinarri-dokumentua idaztea.   |                     | 2009                       |   |
|  | 2- Talde Operatiboaren bilerako deialdia.   |                     | 2009                       |   |
|  | 3- Promozio Plana aurkeztu eta talde operatiboak onartzeko bilera.  |                     | 2009                       |   |
|  | 4- Promozio Plana Etxepare Institutuari aurkeztea.  |                     | 2009                       |   |
| 5 PROIEKTUA:<br>Literatura<br>Unibertsalaren<br>katalogoa<br>osatu.          | 1- Beharrezko datuen eta agente parte-hartzaileen dokumentua prestatzea, datu-bilketa egingo duen (landa-lana) pertsona/enpresa proposatuz. | Bai                 | 2008                       |   |
|  | 2- EIZIEk proposatutakoaren gainean enkargua egitea, beharrezko aldaketak sartuz.   | Bai                 | 2008                       |   |
|  | 3- Lan bukatu eta aurkeztea.  |                     | 2009                       |   |
|  | 4- Talde operatiboaren bilerarako deialdia.   |                     | 2009                       |   |
|  | 5- Talde operatiboaren bilera Manuren lana aurkezteko.  |                     | 2009                       |   |
|  | 6- Lan taldearen bilerarako deialdia, bildutako materiala aztertu eta onesteko.   |                     | 2009                       |   |
|  | 7- Lan taldearen lehen bilera Katalogo Unibertsalaren zerrenda zabaltzeko.  |                     | 2009                       |   |
|  | 8- Zerrenda zabaltzeko proposamena idaztea.   |                     | 2009                       |   |
|  | 9-Zerrenda extraneteen eseki eta sektore guztira zabaldutako ekarpen aldia zabaltzea.   |                     | 2009                       |   |
|  | 10- Euskararen Sustapen Zuzendaritzari aurkezpena egiteko bileraren deialdia.   |                     | 2009                       |   |
|  | 11-Bilera Euskararen Sustapen Zuzendaritzarekin.  |                     | 2009                       |   |
|  | 12- Onartutako proposamena Erakundearteko Batzordera bidaltzea.   |                     | 2009                       |   |

| Proiektua  | Zeregina  | Burutua<br>Bai / ez | Aurreikusitako<br>egutegia | Aurreikusitako<br>zereginak -<br>egingabeak |
|--|---|---------------------|----------------------------|---|
| 6 PROIEKTUA:<br>Euskal Liburuaren<br>Merkatuari<br>buruzko<br>hausnarketa<br>estrategikoa. | 1- Kulturaren Euskal Behatokiarekin datuak identifikatzeko egin beharreko bileraren deialdia. |                     | 2009                       |   |
|  | 2- Bilera Kulturaren Euskal Behatokiarekin.   |                     | 2009                       |   |
|  | 3- EEE eta gremioaren arteko hausnarketa : ikerketa baten beharra dokumentu batean zehaztea.  |                     | 2009                       |   |
|  | 4- Proposamena Talde Operatiboaren aurrean aurkezteko bileraren deialdia.                     |                     | 2009                       |   |
|  | 5- Editoreen elkarteko proposamena aurkezteko Talde Operatiboaren bilera .                    |                     | 2009                       |   |
| Egin beharreko zereginak   |   |                     |                            | 0   |

| PLANIFIKAZIOA    |                 |  | EBALUAZIOA                                    |                                       |
|------------------|-----------------|--|---|---------------------------------------|
| PROIEKTU KOPURUA | ZEREGIN KOPURUA | 2008rako AURREIKUSITAKO ZEREGINAK (KOPURUA ETA OSOAREKIKO PORTZENTAIA) | 2008rako PLANIFIKATUTAKO ZEREGIN BURUTUAK (%) | PLANIFIKAZIO OROKORREAN EGINDAKOA (%) |
| 6                | 37              | 6 (% 16 )  | % 100   | % 16                                  |

## 8- LURRALDE GARAPENA

| Proiektua   | Zeregina   | Burutua<br>Bai / ez | Aurreikusitako<br>egutegia | Aurreikusitako<br>zereginak -<br>egingabeak |
|---|--|---------------------|----------------------------|---|
| 1 - EH eta Diaspora mailan eremu eta lurraldeen ezagutzan eta ikuspenean laguntzeko proposamenak. Kohesio maila altuko proiektu /programen koordinazioa. garapen amankomuna bultzatzeko proiektu berrien diseinua | Internet bidez kanpora zabaltzen diren euskal gizartearen elementuak zehaztuko dituen txosten exekutiboaren osatzea.   | Bai                 | 2008                       |   |
|   | "Euskal Herria ezagutu" argitalpena, Txineraz, errumanieraz, gaztelera, arabieraz, frantsesez, ingelesez eta euskaraz ( 7 hizkuntza) kaleratuko da, kultura, jaiak, gizartea eta politika bezalako gaiak landuz. | Bai                 | 2008                       |   |
|   | Elkartruke programak. EKE rekin sinatutako hitzarmenekin sortutako elkartruke dinamikak sustatzea.   | Bai                 | 2008                       |   |
| 2- Estatistikak eta kultur informazioa  | Kultur Ohituren Ikerketa – Kulturaren Euskal Behatokia   | Bai                 | 2008                       |   |
|   | Artisten zerrenda  |                     | 2009                       |   |
| 3- Komunikabideek lurralde eta esparru amankomunetan duten eraginaren ikerketa.   | Kultur eskaintzaren ikerketa   | Bai                 | 2008                       |   |
|   | ETB3 – "Flash EITB Kultura"  | Bai                 | 2008                       |   |
|   | Kazetarien gida  |                     | 2009                       |   |
| 4- Kanpo presentzia   | "Artisten Zerrenda" Diasporak eskainitako esparruetan osatzeko aukera aztertzea.   |                     | 2009                       |   |
|   | "Euskal Herria ezagutu" argitalpena Diasporan zabaltzea.   |                     | 2009                       |   |

| PLANIFIKAZIOA    |                 |  | EBALUAZIOA                                    |  |
|------------------|-----------------|--|---|--|
| PROIEKTU KOPURUA | ZEREGIN KOPURUA | 2008rako AURREIKUSITAKO ZEREGINAK (KOPURUA ETA OSOAREKIKO PORTZENTAIA) | 2008rako PLANIFIKATUTAKO ZEREGIN BURUTUAK (%) | PLANIFIKAZIO OROKORREAN EGINDAKOIA (%) |
| 4                | 10              | 6 (% 60)   | % 100   | % 60                                   |



## 9- AGIRITEGIAK

| Proiektua  | Zeregina  | Burutua<br>Bai / ez | Aurreikusitako<br>egutegia | Aurreikusitako<br>zereginak -<br>egingabeak |
|--|---|---------------------|----------------------------|---|
| <b>1 Proiektua:<br/>Agiri Funtsen<br/>kudeaketa<br/>eta kontsulta<br/>kolektiboa.<br/>(BADATOR II)</b> | Proiektu informatikoa sektoreari aurkeztea  | Bai                 | 2008                       |   |
|  | Aplikazio informatikoa garatzea.  | Bai                 | 2008                       |   |
|  | Tresna informatikoa sektoreari aurkeztea.   |                     | 2009                       |   |
| <b>2 Proiektua:<br/>Euskadiko<br/>Agiritegien<br/>Mapa</b>   | EAEko Agiritegi Funtsak eta errolda osatzea ( publiko zein pribatuak)   | Ez                  | 2008                       | 1   |
|  | Euskadiko Agiritegien web-gune korporatibo eta amankomuna sortu eta zabaltzea (Badator II)                                      |                     | 2009                       |   |
|  | Badator II sistema elikatzea  |                     | 2009                       |   |
|  | Euskal Agiritegiertzako kalitate estandareak definitzea.  |                     | 2009                       |   |
| <b>3 Proiektua:<br/>Agiritegien<br/>alorrean<br/>trebakuntzara<br/>ko programa<br/>orokorra.</b>       | Agiritegi politika planifikatzeko tresnak garatzea. Formakuntzari buruzko txostena aurkeztea. ( Agenteak eta edukiak zehaztea). | Bai                 | 2008                       |   |
|  | Eusko Jaurlaritzak ALDEEri dirulaguntza ematea agirizaintzako trebakuntza ikastaroak antolatu ditzan.                           | Bai                 | 2008                       |   |
| Egin beharreko zereginak   |   |                     |                            | 1   |

| PLANIFIKAZIOA    |                 |  | EBALUAZIOA                                    |                                       |
|------------------|-----------------|--|---|---------------------------------------|
| PROIEKTU KOPURUA | ZEREGIN KOPURUA | 2008rako AURREIKUSITAKO ZEREGINAK (KOPURUA ETA OSOAREKIKO PORTZENTAIA) | 2008rako PLANIFIKATUTAKO ZEREGIN BURUTUAK (%) | PLANIFIKAZIO OROKORREAN EGINDAKOA (%) |
| 3                | 9               | 5 (55%)  | 80 %  | 44 %                                  |

## 10- LIBURUTEGIAK

| Proiektua  | Zeregina   | Burutua<br>Bai / ez  | Aurreikusi<br>tako<br>egutegia                | Aurreikusitak<br>o zereginak -<br>egingabeak |
|--|--|--|---|--|
| <b>* 1- Euskal Liburutegi Sistema</b>  | 1- KATALOGO BATERATUA Bilbo, Donostia eta Santurtzi liburutegi publikoen on-line sarean sartzea.   | Ez   | 2008  | 1  |
|  | 2- BILGUNEA Liburutegi berrietako katalogoak<br><a href="http://www.liburutegiak.euskadi.net/bilgunea">www.liburutegiak.euskadi.net/bilgunea</a> barruan sartzea                           | Bai  | 2008  |  |
|  | 3- Euskal Erakundeen ondare funts berriak katalogatzea. (PABI, Ondare Bibliografikoa).   | Ez   | 2008  | 1  |
|  | 4- Autoritate eta material elebidunaren katalogoa (AUBI)<br><a href="http://www.liburutegiak.euskadi.net/ubi">www.liburutegiak.euskadi.net/ubi</a>   | Ez   | 2008  | 1  |
|  | 5- Informazioa elkarbanatzeko tresnak erabiltzea (lan metodoa)   | Ez   | 2008  | 1  |
| <b>* 2- Liburutegi Digitala</b>  | 1- Erakunde bat sortzeko aukera aztertzea.   | Bai  | 2008  |  |
|  | 2- Digitalizazioan aditu talde bat sortzea.  | Ez   | 2008  | 1  |
| <b>* 3- Etorrinen jatorrizko herrialdeetako liburu eta aldizkariak ekarzea Liburutegietarako eta hauek atzerriko hizkuntzetako materialekin hornitzea.</b> | 1- Beste hizkuntza batzuetako materiala aukeratu eta erostea   | Bai  | 2008  |  |
|  | 2- Materialak katalogatzea   | Bai  | 2008  |  |
|  | 3- Jardunaldia , <b>jardunaldi tekniko</b> a (egun betekoa) liburuzain eta kultur jardueren sustatzaileei zuzendua. Data aukera : azaro bukaera  | Bai  | 2008  |  |
|  | 4- Liburutegi Zerbitzuen sustapen kanpaina IRAKURRI 2008.  | Bai  | 2008  |  |
| <b>4- Irakurketa Publikoaren Mapa</b>  | Ekintza hauen sarrera moldatu, erratak zuzendu eta datuak sartu ondoren lantzen ari da. 008tik aurrera beste mapa bat idaztea proposatzen da , bere izaera dinamikoak hala eskatzen baitu. | Bai  | 2008  |  |
| <b>5- Irakurzaletasuna eta Liburutegien erabilera sustatzeko kanpaina.</b>   | Ekintza hau burututzat jotzen da, halere kanpaina gehiago burutzea eta egiten ari diren ekintza puntualak indartzea proposatzen da.  | Bai  | 2008  |  |
| Egin beharreko zereginak   |  |  |   | 5  |
| PLANIFIKAZIOA  |  |  | EBALUAZIOA                                    |  |
| PROIEKTU KOPURUA   | ZEREGIN KOPURUA  | 2008rako AURREIKUSITAKO ZEREGINAK (KOPURUA ETA OSOAREKIKO PORTZENTAIA) | 2008rako PLANIFIKATUTAKO ZEREGIN BURUTUAK (%) | PLANIFIKAZIO OROKORREAN EGINDAKOA (%)        |
| 5  | 13   | 13(% 100)  | % 61  | % 61   |

\* 1. Kulturaren Euskal Planetik jasotako proiektua.

## ONDAREA

| Proiektua  | Zeregina   | Burutua<br>Bai / ez | Aurreikusitako<br>egutegia | Aurreikusitako<br>zereginak -<br>egingabeak |
|--|--|---------------------|----------------------------|---|
| 1 Proiektua: Kultur ondareko lan taldea sortzea.   | 1- Euskal Ondarearen gaineko proposamenak egingo dituen Batzordea eratzea.                                     | Bai                 | 2008                       |   |
| 2 Proiektua: ZAIN. Ondarearen Ikerketa eta Formakuntzaren Euskal Zentroa sortzea.                  | 1- Ondarearen Ikerketa eta Formakuntzaren Euskal Zentora zehaztea / Etorkizuneko egoitzaren proiektua idaztea. | Bai                 | 2008                       |   |
|  | 2- ZAIN Fundazioaren eraketa   | Bai                 | 2008                       |   |
|  | 3-ZAIN lan taldearen kokatze prozesua –EHU Ikerketa Zentroa – (Virgen de Las Nieves kalea – Gasteiz)           |                     | 2009                       |   |
|  | 4- Kokaleku definitiboa  |                     | 2011                       |   |
| 3 Proiektua: Ondareak Euskal BPGean egindako ekarpenaren analisia.                                 | 1- Lan taldearen proposamena : Ondareak euskal BPGean egindako ekarpenaren analisia.                           | Bai                 | 2008                       |   |
|  | 2 Talde Operatiboak dokumentazioa ikertzaile taldeari bidaltzea.   | Bai                 | 2008                       |   |
|  | 3- Ikerketa proposamenaren onespren definitiboa.   | Ez                  | 2008                       | 1   |
|  | 4- Ikerketaren garapena  |                     | 2009                       |   |
| 4 Proiektua. Kultura Sailak Kultur Ondarearen Kudeaketa eta Mantenuan aurreikusitako %1 Kulturala. | 1-Lurralde bakoitzeko aplikazio ereduaren txosten konparatiboa.  | Bai                 | 2008                       |   |
|  | 2- Aplikazio ereduaren analisia Erakundeartekoan.  | Ez                  | 2008                       | 1   |
| Egin beharreko zereginak   |  |                     |                            | 2   |

| PLANIFIKAZIOA    |                 |  | EBALUAZIOA                                    |                                       |
|------------------|-----------------|--|---|---------------------------------------|
| PROIEKTU KOPURUA | ZEREGIN KOPURUA | 2008rako AURREIKUSITAKO ZEREGINAK (KOPURUA ETA OSOAREKIKO PORTZENTAIA) | 2008rako PLANIFIKATUTAKO ZEREGIN BURUTUAK (%) | PLANIFIKAZIO OROKORREAN EGINDAKOA (%) |
| 4                | 11              | 8 (% 72)   | % 75  | % 55                                  |

## 12- MUSEOAK


| Proiektua  | Zeregina                                   | Burutua<br>Bai / ez   | Aurreikusit<br>ako<br>egutegia                   | Aurreikusitako<br>zereginak –<br>egin gabeak |
|--|--|---|--|--|
| * 1 Proiektua :<br>Museoen Sistema<br>Informatikoa<br>ezartzea | Proiektu informatikoa sektoreari aurkeztea | Bai   | 2008   |  |
|  | Aplikazio informatikoa garatzea.           | Bai   | 2008   |  |
|  | Tresna informatikoa sektoreari aurkeztea.  |   | 2009   |  |
| PLANIFIKAZIOA  |  |   | EBALUAZIOA                                       |  |
| PROIEKTU KOPURUA   | ZEREGIN KOPURUA                            | 2008rako AURREIKUSITAKO<br>ZEREGINAK ( KOPURUA ETA<br>OSOAREKIKO PORTZENTAIA) | 2008rako PLANIFIKATUTAKO ZEREGIN<br>BURUTUAK (%) | PLANIFIKAZIO OROKORREAN<br>EGINDAKOA (%)     |
| 1  | 3  | 2 (% 66)  | % 100  | % 66   |

## 13- MUSIKA ETA FONOGRAFIA


|   |   |
|---|---|
| <b>Talde operatiboa oraindik lanean hasi ez diren proiektu batzuk zehazten hasi da.</b> | Epe luzerako sentsibilizazio programak (epe luzerako oinarriak) zehaztuko dituen lan talde bat osatzea. |
|   | <b>Musikagileentzako enkargu politika</b> bat sustatzea.  |
|   | <b>Euskal musikari eta sortzaileen Elkarte baten sorrera bultzatzea.</b>                                |
|   | <b>Programazio zirkuitu publiko eta pribatuak sortzea.</b>  |
|   | <b>Ekimenak eta informazioa koordinatzeko zentro bat sortzea.</b>                                       |
|   | <b>Euskal musikaren web-gunea indartzea.</b>  |


\* I. Kulturaren Euskal Planetik jasotako proiektua.

# 14- BETETZE-MAILAREN BALANTZE OROKORRA




## SEKTOREETAKO PROIEKTU KOPURUA

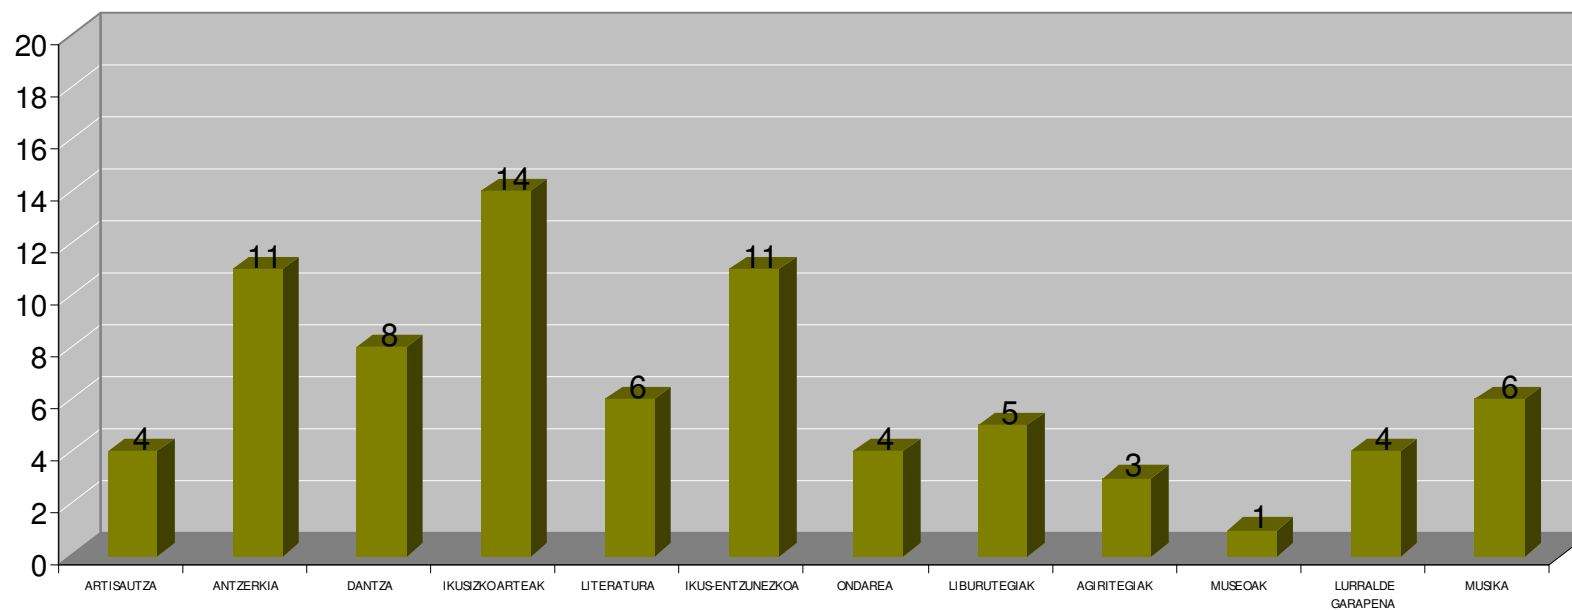


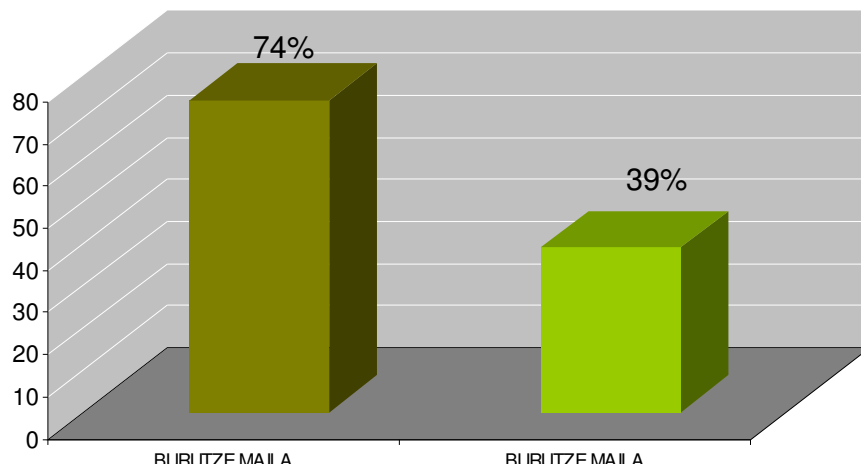

**2008ko PLANIFIKAZIOAN EGINA (%etan)**

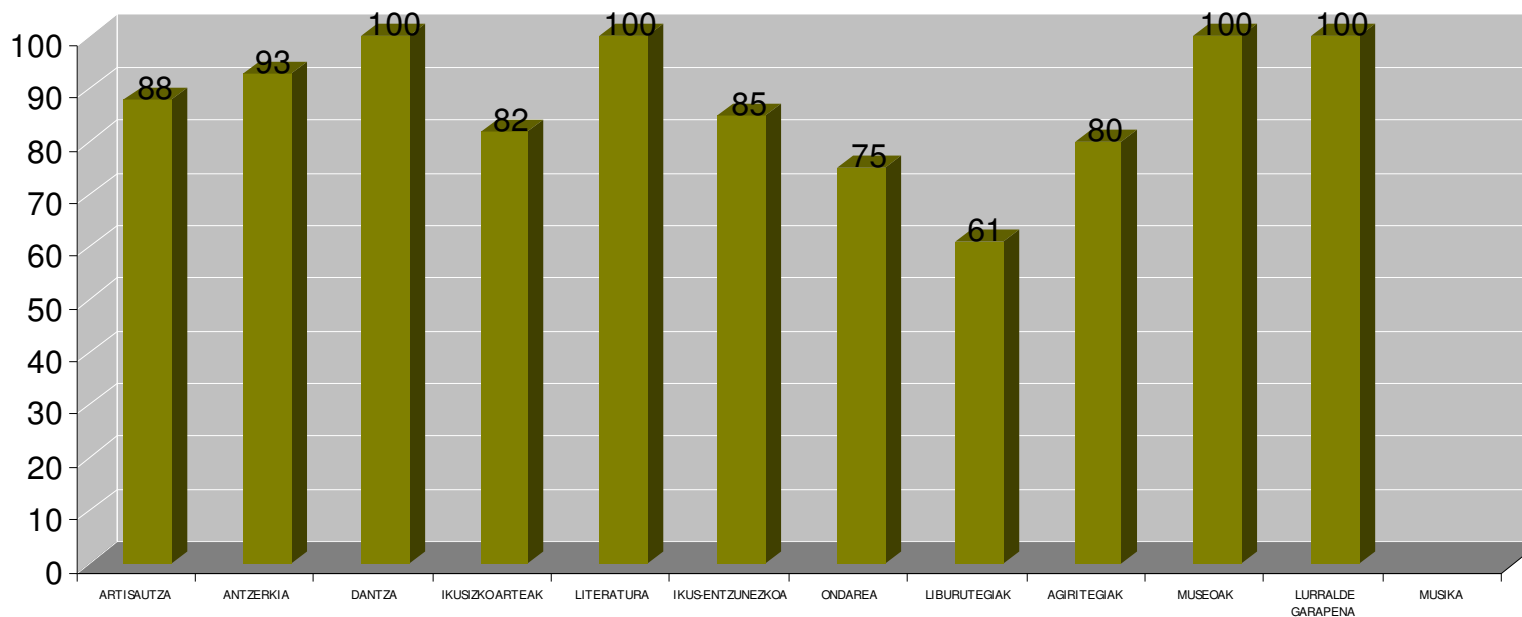

### 2010 erako PLANIFIKAZIOAN EGINA (%etan)

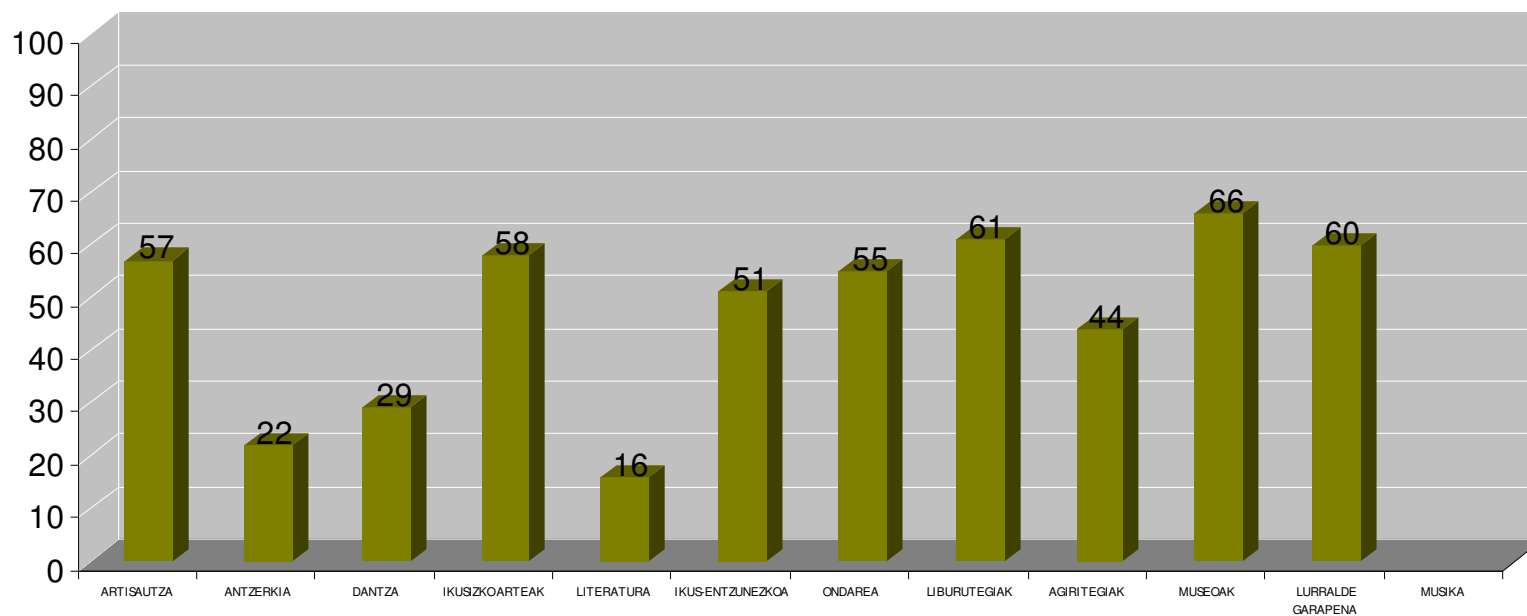

# 14- BETETZE-MAILAREN BALANTZE OROKORRA

| SEKTOREA          | PROIEKTU KOPURUA | ZEREGIN KOPURUA | 2008rako AURREKUSITAKO ZEREGINAK. (Kopurua eta orokorrean egindakoa %) | 2008rako aurreikusitako zereginetan egindakoen % | PLANIFIKAZIO OROKORREAN EGINDAKOA % |
|-------------------|------------------|-----------------|--|--|-------------------------------------|
| ARTISAUTZA        | 4                | 14              | 9 (%65)  | % 88   | % 57                                |
| ANTZERKIA         | 11               | 64              | 15 (% 23)  | % 93   | % 22                                |
| DANTZA            | 8                | 58              | 13 (% 29)  | % 100  | % 29                                |
| IKUSIZKO ARTEAK   | 14               | 26              | 17 (% 65)  | % 82   | % 58                                |
| LITERATURA        | 6                | 37              | 6 (% 16)   | % 100  | % 16                                |
| IKUS-ENTZUNEZKOA  | 11               | 35              | 21 (% 60)  | % 85   | % 51                                |
| ONDAREA           | 4                | 11              | 8 (% 72)   | % 75   | % 55                                |
| LIBURUTEGIAK      | 5                | 13              | 13 (%100)  | % 61   | % 61                                |
| AGIRITEGIAK       | 3                | 9               | 5 (% 55)   | % 80   | % 44                                |
| MUSEOAK           | 1                | 3               | 2 (% 66)   | % 100  | % 66                                |
| LURRALDE GARAPENA | 4                | 10              | 6 (% 60)   | % 100  | % 60                                |
| MUSIKA            | 6                | Definitzeke     |  |  |                                     |
| <b>GUZTIRA</b>    | <b>72</b>        | <b>280</b>      | <b>115 ( %47 )</b>   | <b>% 74</b>                                      | <b>% 39</b>                         |

| PLANIFIKAZIOA    |                 |   | EBALUAZIOA                                    |                                       |
|------------------|-----------------|---|---|---------------------------------------|
| PROIEKTU KOPURUA | ZEREGIN KOPURUA | 2008rako AURREKUSITAKO ZEREGINAK (KOPURUA ETA OSOAREKIKO PORTZENTAIA) | 2008rako PLANIFIKATUTAKO ZEREGIN BURUTUAK (%) | PLANIFIKAZIO OROKORREAN EGINDAKOA (%) |
| <b>71</b>        | <b>280</b>      | <b>115 (47 %)</b>   | <b>74 %</b>                                   | <b>39 %</b>                           |
